

Vision Tidö-Lindö

Förnyelse av vår ö med stöd av EU-medel

Slutrapport, maj 2021

Lars Hallstadius

Koordinator för projektet

Heidi Leppäniemi, Hans Thell, Mårten Gustafsson

Medlemmar i projektets styrgrupp

”Tidö-Lindö är en mälarö där alla trivs, har möjlighet till en rik fritid, friluftsliv, upplever trygghet, gemenskap och har ett gemensamt engagemang att förvalta de naturvärden som finns på ön till kommande generationer”



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



Lokalt ledet utveckling
LEADER
MÄLARDALEN

Projektets organisation

- **Koordinator:** Lars Hallstadius
- **Ekonomi:** Michaela Sandvall
- **Styrgrupp:**
 - Mårten Gustafsson
 - Hans Thell
 - Heidi Leppäniemi
 - Lars Hallstadius
- **Ledare för aktiviteterna (delprojekten):**
 - Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi
 - Utegygym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck
 - Vädterskydd: Daniel Lind
 - Badstrand: Regina Tunebrant

Tidslinje

- | | |
|--|-----------------|
| • Första förberedelser, bildande av styrgrupp | 2016, våren |
| • Enkäten ("vad vill våra medlemmar") | 2016, december |
| • Årsstämmans klartecken för ansökan | 2017, april |
| • Inlämning steg 2 ansökan | 2017, september |
| • Slutligt godkännande av ansökan | 2018, april |
| • Nya stigen P-plats – stranden – norra udden | 2019, maj |
| • Strandområdet: Ny sand, gungor, mm, mm | 2019, maj |
| • Invigning av utegygymmet | 2019, juni |
| • Vädterskyddet färdigbyggt och el installerad | 2020, januari |
| • Strandområdet klart | 2020, juli |
| • Naturvårdsplanen klar | 2021, februari |
| • Projektavslut | 2021, hösten |

1. Inledning

Tidö-Lindö är en ö i Mälaren med drygt 330 bostäder, varav ett femtiotal sommarhus. Alla är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening, med gemensamt ägandeskap och ansvar för öns vägnät, grönområden och västerängsområdet med bl. a lekplats, badstrand och föreningshus.

Projektet, sedermera döpt till "Vision Tidö-Lindö", föddes fram under våren 2016, i diskussioner mellan Hans Thell, Heidi Leppäniemi och Lars Hallstadius. Hans kände till möjligheten att få EU-stöd till förnyelseprojekt, via LEADER*, Heidi hade med sin bakgrund som folkhälsovetare många uppslag hur ön skulle kunna bli ännu bättre, och Lars var ordförande i styrelsen för samfällighetsföreningen. Eftersom vård av öns natur, och en väl underbyggd och förankrad naturvårdsplan, låg högst på vår önskelista bjöd vi även in Nicklas Monrad, styrelsens ansvarige för öns grönområden, till det som kom att bli projektets styrgrupp. (Nicklas avgick senare av personliga skäl och ersattes av Mårten Gustafsson, i såväl samfällighetens styrelse som styrgruppen).


Vi var som sagt överens om att öns unika naturvärden hade hög prioritet i ett eventuellt projekt, och tog därför kontakt med Kristina Hansson, naturvårdsexpert vid Länsstyrelsen, för fördjupad förståelse och en gemensam rundvandring med preliminär inventering av öns olika naturområden. Den resulterande rapporten sammanfattar bl. a Kristinas förslag till naturvårdande åtgärder och återfinns på samfällighetens hemsida: <http://www.doc.tidolindo.se/1609-Rundvandring.pdf>.

Frågan om vad mer som borde/kunde ingå i ett projekt beslöt vi att besvara med hjälp av en enkät till alla öns hushåll, se nästa avsnitt. Utöver att besvara frågan förankrade vi på så sätt projektet hos samfällighetens medlemmar.

Vi tog i ett tidigt stadium kontakt med det lokala LEADER-kontoret för att förstå spelreglerna (exakt vad kan/vill LEADER stödja, ansökningsprocedur, etc.) och stämde sedan löpande av med LEADERs representant. Värdet av ett sådant nära samarbete kan inte överskattas.

Visionen i projektets namn, "Vision Tidö-Lindö", är en sammanfattning av vad vi ville åstadkomma, i helikopterperspektiv:

"Tidö-Lindö är en mälärö där alla trivs, har möjlighet till en rik fritid, friluftsliv, upplever trygghet, gemenskap och har ett gemensamt engagemang att förvalta de naturvärden som finns på ön till kommande generationer".

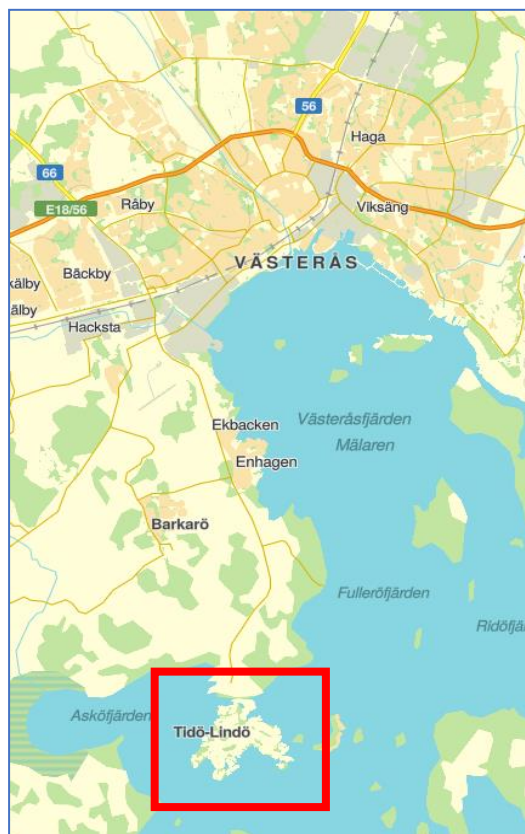

* Liason Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, www.leadermalardalen.se/

2. Enkäten

Det primära syftet med enkäten var att bättre förstå vilka aktiviteter, utöver naturvårdsplanen, vi skulle inkludera i Vision Tidö-Lindö, och i ansökan till LEADER. Samtidigt tjänade enkäten till att förankra projektet, och dess innehåll, hos öborna. Sist men inte minst var detta ett förfarande som uppskattades av LEADER och gav pluspoäng den dag vår ansökan prövades: Vi hade evidens för att vi sökte pengar till rätt saker.

Enkäten skickades ut till alla medlemmar (i samfälligheten) vi kunde nå, primärt via email, i andra hand med ett kuvert i deras postlåda. För enstaka medlemmar, huvudsakligen sommarboende, fanns varken aktuell mailadress eller postlåda; dessa valde vi att utesluta.

Enkäten skickades ut i november 2016, med 11 december som sista dag för svar. Förstasidan, med bakgrund och instruktioner, visas i bilaga 1.

Vi uppmanade mottagarna att i första hand svara över internet, via en länk som vi förmedlade. För de som inte kunde/ville detta accepterade vi svar på papper.

Resultatet av enkäten redovisades vid det möte vi bjöd in medlemmarna till i mars 2017.

Sammanfattningen visas i bilaga 2 och den kompletta presentationen med alla svar finns på hemsidan under fliken "Vision Tidö-Lindö", eller här: <http://www.doc.tidolindo.se/Enkatresultat.pdf>.

Drygt 200 hushåll svarade, vilket innebär en svarsfrekvens om ca 60 %. Denna höga siffra avspeglar ett uppenbart stort engagemang hos våra medlemmar. Vid nämnda enkätmöte deltog även Kristina Hansson från Länsstyrelsen (samma naturvårdsspecialist som hjälpte oss med den preliminära inventeringen) och Mia Lundqvist från det lokala LEADER-kontoret. Deras presentationer återfinns också på hemsidan, under fliken "Vision Tidö-Lindö" eller här:

<http://www.doc.tidolindo.se/170315-Lansstyrelsen.pdf> och
<http://www.doc.tidolindo.se/170315-LEADER.pdf>.

Mia Lundqvist var mycket nöjd med det sätt enkäten lagt grunden för en bra och meningsfull ansökan till LEADER.

3. Ansökan

Årsstämman i april 2017 tillstyrkte, med överväldigande majoritet, att gå vidare med en ansökan till LEADER.

Vid formuleringen av denna vägde vi ihop de olika aspekterna:

- Beloppets storlek: Tillräckligt mycket för att verkligen kunna "göra något" men inte så stort att LEADER och deras styrelse (LAG) skulle få svårigheter att godkänna det. Vi enades med LEADERs representant om ett belopp strax över en halv miljon.
- Resultatet av enkäten, dvs den färgkodade tabellen i slutet av bilaga 2, tillsammans med de efterföljande kommentarerna.
- LEADER Mälardalens överordnade målsättningar, "horisontella mål", skall beaktas: Jämställdhet, integration/mångfald (social sammanhållning) och miljö.
- Frivilliga insatser från oss på ön: Minst 30% av projektets totala värde måste utgöras av obetalt arbete. Projektets innehåll måste alltså lämpa sig för ganska omfattande egna

insatser.

- Vi behövde, enligt LEADERs föreskrifter, utse en eller flera samarbetspartners. Länsstyrelsen var redan delaktig, och grann-samfälligheten (Eriksbo Park) föll sig naturligt med tanke på närheten och deras givna intresse för våra anläggningar på Västerängen. Eriksbo Parks styrelse var införstådd och vi gjorde även en presentation vid deras samfällighets årsstämma.

De kostnads- och tidsatta momenten i ansökan utgjordes av:

1. En långsiktig och välförankrad naturvårdsplan, baserad på grundlig inventering av, och kunskap om, förekommande biotoper. I delprojektet ingick även en ny, tillgänglighetsanpassad gångstig till badstranden och informationsmaterial (ö-guide).
2. Ett belyst utegym med tio redskap och pingisbord, på västerängsområdet
3. En samlingsplats, centralt på västerängsområdet, i form av ett väderskydd med grillmöjlighet och bänkar (ibland benämnt "grillkåta").
4. Förnyelse av strandområdet.
5. Avslutningsfest där vi i vernissage-form visar foton tagna av öbor. (Denna kostnadsmässigt mindre post bakade vi senare in under första punkten).

I början tänkte vi även inkludera en större pulkabacke, i enlighet med enkätsvaren. Vi släppte dock denna, med motiveringen att det redan fanns en pulkabacke hos vår samarbetspartner, Eriksbo Park, plus att kostnaden var relativt låg, dvs samfälligheten skulle kunna bekosta en backe inom de normala budgetramarna. (Vilket skedde år 2020).

Ansökan nämnde även ett antal insatser av obetald karaktär och utan tidplan:

- Fler och bättre gångstigar genom öns naturområden
- Säkerhets- och livräddningskurser
- Tillgodose barns och ungas intressen

Det var mycket "pyssel" med framtagning av ansökan. Alla planerade utlägg måste styrkas av två oberoende offerter, och detaljerna granskades grundligt av LEADERs organisation. Ansökan Steg 1 lämnades in i juni 2017, följt av Steg 2 i september 2017. Den godkändes, efter flera iterationer och en lyckad dragning inför LEADERs styrelse (LAG), i april 2018. Det sökta beloppet, knappt 700 000 kr (698 858 kr), beviljades utan avdrag.

Det var viktigt för LAG att de finansierade anläggningarna blir tillgängliga för alla som kan ta sig till ön, dvs inte enbart för medlemmarna i samfällighetsföreningen. För oss var detta en självklarhet, och den blivande cykelvägen mellan Tidö-Lindö och Enhagen, finansierad av Trafikverket och Västerås stad, kommer att ytterligare öka tillgängligheten.

För vart och ett av de fyra delprojekten ovan ("aktiviteterna"), där nr 5 som sagt inkorporerades under den första) utsågs en ansvarig, frivillig öbo. (Av praktiska skäl leddes utegyms-aktiviteten av två personer). Den kompletta projektstrukturen (se sid 2), som även omfattade en ekonomiansvarig, presenterades i ansökan och fungerade utan ändring till projektets avslut.

4. Genomförande och resultat

Aktivitetsledarna (sid 2) koordinerade, och ansvarade för, sina respektive delprojekt och engagerade (andra) frivilliga krafter efter behov och möjlighet. Styrgruppen stödde det hela med råd och dåd, och vid behov hjälp med beslut.

I början disponerade delprojekten de pengar som öronmärkts i ansökan, men efterhand lyfte vi blicken och omdisponerade medel med hänsyn till utfall och behov: Vissa saker blev av olika skäl billigare än tänkt, medan annat behövde få kosta litet mer. Styrgruppen var, naturligt nog, drivande i denna process för optimering i ett helhetsperspektiv.

I samband med ansökan tog vi in offerter på samtliga planerade inköp. Det stod oss sedan fritt att utnyttja dessa, alternativt välja bättre och/eller billigare lösningar.

Vi erbjöd företag med lokal anknytning möjlighet att sponsra projektet och på så vis möjliggöra ett mer omfattande eller påkostat innehåll. All sponsring föll inom ramen för de definierade aktiviteterna och som komplement till EU-anslaget.

Sponsorerna omnämns på en anslagstavla vid en av ingångarna till västerängsområdet, samt på en skylt i föreningshuset, och alla som bidragit med frivillig (obetald) tid omnämns på samma skylt i föreningshuset. Se vidare avsnitt 5 och bilaga 8–9.

4.1 Naturvårdsplanen mm

4.1.1 Naturvårdsplanen

En bra introduktion till naturen på Tidö-Lindö finns i ö-guiden, se avsnitt 4.1.3.


Syftet med naturvårdsplanen är att i detalj beskriva hur naturen på ön skall tas om hand, baserat på en grundlig inventering och aktuellt kunskapsläge. Den ser olika ut för öns olika delområden, med sina karakteristiska egenskaper och biotoper, och utgör nu basen för Styrelsens och de lokala allmänningssgruppernas vård av våra gemensamma grönytor.

Skötselplanen, tillsammans med bakgrund och målbilder, ligger under fliken "Naturvårdsplan" på vår hemsida. Så säkerställs att planen lever vidare till framtida styrelser och generationer av öbor, samtidigt som den lätt kan modifieras när förutsättningar eller kunskapsläge ändras.

4.1.2 Nya och nygamla stigar

Befintliga stigar, vissa helt igenvuxna, röjdes så att vi återskapade det mer omfattande nätverk av gångbara stigar som fanns kring år 2000. Aktuell karta, nedan, är kopierad från ö-guiden och återfinns med full upplösning i denna (se nästa avsnitt).

Vi skapade också en helt ny, tillgänglighetsanpassad stig från parkeringsplatsen, längs vattenkanten söder om



stranden, vidare bakom sandstranden och ända ut till norra udden. Delar av stigen kan ses i bilaga 5.



4.1.3 Informationsbroschyr, "Ö-guiden"

Syftet med ö-guiden var att, på ett intressant och smakfullt sätt, presentera Tidö-Lindö. Fokus ligger på naturen och det unika växt- och djurlivet, men man finner också en sammanfattning av öns historia, en karta över gång/naturstigar samt tips om vad man kan se och göra på ön.

Den primära målgruppen är de som bor på Tidö-Lindö: Genom Styrelsens försorg har alla fått ett ex i sin postlåda, och nyinflyttade kommer att få broschyren som en del av välkomstpaketet.

En länk till ö-guiden finns på vår hemsida, under fliken "Vision Tidö-Lindö".




4.2 Utegygmet

Gymmet byggdes på en före detta strandäng, i direkt anslutning till övriga anläggningar på Västerängen. Eftersom området periodvis är ganska sankt höjde vi marknivån med ca 50 cm.

Valet av redskap gjordes tillsammans med Marie Hammarbäck, som är specialist på friskvårdsfrågor. Gymmet ligger intill

lekplatsen: Även barnen skall naturligtvis känna sig välkomna och därvid inte utsättas för större risker än på en vanlig lekplats. Vi valde därför bort vissa potentiellt farliga redskap, som bomlyft.

Bildsekvensen i bilaga 3 redovisar, tillsammans med bildtexterna, hur gymmet växte fram.

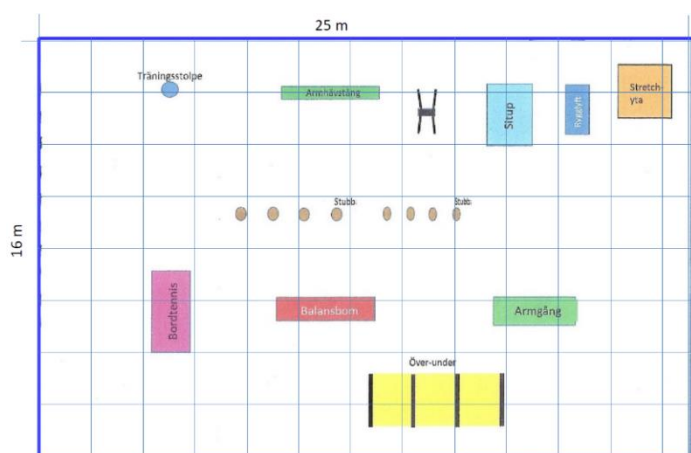

Planering av utegymmet, med tio redskap och pingisbord

4.3 Vädterskyddet

Vädterskyddet uppfördes i omedelbar anslutning till lekplatsen, med sin öppna sida vänd mot denna, dvs i riktning syd-sydöst. Markberedningen samordnades med utegymmet, för minimering av total kostnad.

Bilaga 4 visar, i bilder och bildtexter, hur vädterskyddet byggdes.



4.4 Förnyelse av strandområdet

Delprojektet (aktiviteten) omfattade:

- Ny sand på stranden, grovkornigare nära vattenkanten och i övrigt finkornig, skön att ligga på och bra att leka i.

- Gungställning.
- Ny, tillgänglighetsanpassad stig från P-platsen längs vattenkanten, vidare innanför stranden och ut till norra udden.
De två närmaste bilplatserna på parkeringen skyltades som handikapplatser.



- En ny fikaplatz mellan föreningshuset och stranden, med nytt picknickbord
- Uppsnyggning av båda uddarna inklusive nya bänkar.
- Picknickplats i skugga, nära södra udden.
- Grillplats med ny betonggrill i norra änden av stranden.
- Hundbadplats med skylt, norr om badstranden
- Två informationsskyltar, en vid den nya stigens början på P-platsen, den andra på strandområdet, vid ingången nära föreningshuset
- Allmän uppsnyggning

Målbilden sammanfattas i de två skisserna överst i bilaga 5.

Planen modifierades något under arbetets gång, beroende på nya insikter och möjligheter:

- Norra udden har öns bästa sjöutsikt, speciellt vid solnedgång. Vi valde därför att flytta in grillen till norra änden av strandområdet, och vika själva udden för vila och kontemplation
- Grönytan vid informationsskylten skulle kräva regelbunden bevattning, vilket inte är realistiskt. Istället anlade vi den nya fikaplatsen här.
- Vi valde bort ny sand ute i vattnet. Dels var behovet måttligt, dels skulle kostnaden för utläggningen ha blivit relativt hög.
- Informationsskylten vid den nya strandstigens ingång tillkom efter beslut i styrgruppen. Ekonomiskt utrymme skapades genom att skippa kantbalkarna till utegymmet (vilka skulle varit av huvudsakligen kosmetisk karaktär).

I den ursprungliga planen ingick en träspång längs vattenkanten (som del av den nya stigen), utmynnande i ett soldäck på södra udden. Vid närmare eftertanke insåg vi att ett trädäck längs vattenkanten skulle uppmuntra till dykning, vilket i det aktuella området kunde slutat mycket illa.

Bilaga 5 redovisar i bilder och bildtexter hur arbetet fortskrider. I slutet av bilagan visas innehållet från informationsskyltarna.

4.5 Säkerhets- och livräddningsutbildning

4.5.1 Uppvisning av sjöräddningssällskapets båtar och utrustning

Den 18 maj 2019 besökte Sjøräddningen badstranden på Tidö-Lindö, visade upp två räddningsbåtar och utrustning, samt pratade om sjösäkerhet/sjövätt. Aktiviteten blev mycket uppskattad av de drygt hundra personer som deltog, inklusive många barn som gillade att åka räddningsbåt och testa brandsprutan. I caféet kunde gott hembakat och varmkorv med bröd inhandlas.

Vi passade även på att ta upp anmälningar till den kommande aktiviteten: HLR-utbildning. Några ytterligare foton finns i bilaga 7.



4.5.2 Hjärt-lungräddning (HLR)

Många människor drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp. Därför startade vi aktiviteten "HLR-utbildning" till vilken vi fann en ideell utbildare hos vår samarbetspartner Eriksbo Park. Tack vare tre lokala företags sponsring av utbildningsdockor täcktes kostnaderna av deltagaravgiften, och vi kunde även skänka en slant till Hjärt- och Lungfonden.

Tre tillfällen kördes under juni-november 2019, med upp till 8 deltagare per tillfälle. Fler bilder finns i bilaga 7.



4.5.3 Isvett

Den 15 januari 2020 höll Långfärdsskridskoklubben LiV en kurs i iskunskap/isvett, i västerängslokalen. Ca 35 öbor deltog i det mycket uppskattade mötet.

Vi fick lära oss hur man kan bedöma isens bärighet, hur isens tjocklek varierar med lokala förhållanden, och hur man bör bete sig för att minimera risken för ett tillbud. Dessutom beskrev LiV de lokala förhållandena, exempelvis var någonstans utanför ön isen lägger sig först (Asköviken) och var man definitivt aldrig skall åka.



4.6 Barn och ungdom

En uttalad målsättning med projektet var att öbor i alla åldrar skulle få glädje av resultatet, dvs trivas (ännu) bättre på ön, med mindre behov av att åka någon annanstans på sin fritid. (Jämför *Visionen* på denna rapports framsida).

I ett barn- och ungdomsperspektiv vill vi lyfta fram följande resultat:

- Ett utegym som fungerar för de flesta åldrar
- En bättre och trivsammare badstrand
- Gungställning på stranden
- Vädskyddet - en samlingsplats för öbor i alla åldrar
- Vi uppmuntrar (i ö-guiden) till mountain-biking på några av våra naturstigar
- I enkäten önskade man sig en högre pulkabacke. En sådan anlades 2020 på Västerängen, utanför projektets ramar

En långsiktig målsättning är att skapa större möjligheter för öns (äldre) barn och ungdomar att föra fram egna synpunkter direkt till Styrelsen, dvs föra en dialog rörande frågor som känns viktiga för de unga.

4.7 Projektets avslut

4.7.1 Fotovernissage - fototävling - bildbibliotek

Ursprungligen var det tänkt att sommaren 2020 kombinera en avslutningsfest med visning av valda bilder, tagna av invånare på ön. Pga. corona-relaterade restriktioner/rekommendationer beslöt vi dock att skjuta fram avslutningsfesten till maj 2021. (Senare beslöt vi att ställa in festen helt, eftersom corona-restriktionerna låg kvar).

Istället anordnade vi en fototävling, där de bästa bilderna, tagna och framröstade av öborna, trycktes upp på canvas och hängdes på föreningslokalens väggar. Samtidigt la vi grunden till ett bildbibliotek som kommer att finnas kvar, tillgängligt för alla på ön och med möjlighet att efter hand lägga till nya vackra och/eller intressanta bilder.

Under våren 2020 bjöd vi in att bidra med bilder till tävlingen, på temat "*Livet och naturen på Tidö-Lindö*", via vår hemsida, öns Facebook-grupp samt i kallelsen till årsstämman. Vi fick in sammanlagt 169 bilder.

Omröstningen, som gjordes per e-mail, resulterade i relativt få röster, varför det inte fanns några riktigt tydliga vinnare. Vi utsåg därför de 29 bilder som fick poäng, dvs minst en röst, till finalister, för en andra omröstning i samband med årsstämman den 24 augusti 2020.

De 29 bilderna nålades då upp på föreningshusets vägg, och stämmans deltagare röstade med penna och papperslapp, se bilaga 6. Bilderna sorterades i två kategorier, "Natur" och "Människor och tradition".

De sex vinnande bilderna hänger nu i föreningslokalen (bilaga 6).

Bidragen till fototävlingen ligger nu i öns bildbibliotek, tillsammans med bidrag inskickade senare. Alla öbor är välkomna att skicka sina bilder till den mail-adress som anges på vår hemsida, under fliken "Vision Tidö-Lindö".

På samma plats finner man även länken till bildbiblioteket.

5. Frivilligt arbete och sponsring

Enligt LEADERs förutsättningar skall minst 30% av projektets totala värde utgöras av frivilligt (obetalt) arbete. Med ett anslag om ca 700 000 kr (698 858 kr) motsvarar detta obetald tid till ett värde av minst ca 300 000 kr, eller ca 1360 timmar med schablonvärdet 220 kr/timme.

Vi har registrerat sammanlagt 2183 frivilliga timmar, vilket är långt mer än kravnivån, närmare bestämt 160 %. Namnen på alla de som engagerat sig, och satsat obetald tid, återfinns i bilaga 8 och på en skylt i föreningshuset.

Tolv företag med lokal anknytning har på olika vis sponsrat projektet och på så vis utökat innehållet inom ramen för LEADERs anslag. Det rör sig om såväl pengar, insatta på projektets konto, som material och/eller bekostande av professionella anläggnings-insatser.

Sponsorerna omnämns på informationstavlan vid strandstigens början (bilaga 5 och 9) samt på en skylt i föreningshuset (tillsammans med de frivilliga krafterna).

Bilaga 1. Enkätens inledande sida

Styrelsen för Tidö-Lindö Samfällighetsförening vill med denna enkät skapa en samlad bild av hur vi alla på ön vill vårda och utveckla det vi gemensamt ansvarar för, exempelvis grönområden och Västerängen.

I enkäten får du ta ställning till frågor inom några olika områden. Det finns också utrymme att lägga till goda idéer.

Resultatet från enkäten kommer att bilda underlag för en Vision och långsiktig plan med prioriteringar. De arbeten och åtgärder som planen utmynnar i kommer naturligtvis att hållas inom de ramar som våra stadgar beskriver och beslutas om på föreningsstämman (årsmötet) i vanlig ordning.

Vi går genom resultatet på ett gemensamt möte under vintern.

Styrelsen har tillsammans med en projektgrupp under året gjort ett arbete, bland annat tillsammans med länsstyrelsen tittat på naturvärden på våra allmänningar. Projektgruppen har också fört samtal med LEADER*. Det finns goda möjligheter att genom LEADER få externa medel (EU-pengar) till att göra sådant som vi skulle vilja, men som inte ryms inom den vanliga årsbudgeten. De ser nu fram emot en ansökan från oss.

Styrelsen kommer lägga en proposition om denna ansökan vid årsstämman i april.

Så svara på enkäten. Vi ser helst att ni gör det över internet, men det går även bra i pappersform. Enkäten i pappersform kommer landa i brevlådan för dom som vi inte har en mailadress till. Skulle den av någon anledning ej komma så kan den fås från Nicklas Monrad (Styrelsens allmänningsansvarige tillika koordinator för projektgruppen), Strandvägen 30.

Länken fungerar bara en gång och upphör när du trycker på "skicka svar" längst ner". Ni som bor fler under samma tak fyller i en enkät per hushåll, gärna i dialog med alla familjemedlemmar. Det går alltså inte att skicka in flera svar från samma familj.

Det bor många barn och ungdomar på ön - för dem finns en separat del i enkäten som vi hoppas föräldrar hjälper sina barn att fylla i. Ungdomar svarar naturligtvis själva. Som ungdom räknas du som är 14-18 år.

Enkäten är anonym, det kommer alltså inte att framgå vem som svarat vad.

Vi hoppas att alla tar chansen att fylla i enkäten.
Svaren måste vara inne senast söndagen den 11 december.

Tack på förhand!
Styrelsen för samfällighetsföreningen
Projektgruppen "Utveckla Tidö-Lindö"



Vision Tidö-Lindö

Möte den 15 mars 2017

"En natur, som kan smälta vilket hjärta som helst, står till buds"

VLT den 1 augusti 1959

Agenda



- Inledning
- Naturen på Tidö-Lindö och Länsstyrelsens roll (Kristina Hansson, Länsstyrelsen)
- Resultat från enkäten (Nicklas)
- Sammanställning av kommentarer i enkäten (Heidi)
- Fika
- Information från LEADER (Mia)
- Projekt "Vision Tidö-Lindö" och ansökan till LEADER (Heidi)
- Sammanfattning och nästa steg (Nicklas)

Enkäten - översikt



- Syfte
 - Bättre förstå vad man önskar sig på Tidö-Lindö
 - Underlag till långsiktig plan för vård och utveckling av ön
 - ... och för ansökan om externa medel (till LEADER)
- Distribuerades per mail eller papper i december 2016
 - En per familj
- Drygt 200 familjer svarade
 - Mycket bra svarsfrekvens (60%)
- Tio A4-sidor med egna tankar och funderingar

På några platser vid vattenkanten, med tre vatten, satta bänkar upp

☐ Mycket intressant
☐ Intressant
☐ Inte intressant

Västerängen

Utomhusgym på Västerängen

☐ Mycket intressant
☐ Intressant
☐ Inte intressant

En bad grillplats med tak på Västerängen

☐ Mycket intressant
☐ Intressant
☐ Inte intressant

Löpspår på 1-2 km runt Västerängen

☐ Mycket intressant
☐ Intressant
☐ Inte intressant

Öka trafiksäkerheten på en

För höghastighetsbussens åtgärder

☐ Mycket intressant
☐ Intressant
☐ Inte intressant

Öka den svarta "mycket intressant" eller "intressant" på följande frågor, vilken form av förändring skulle du föredra

☐ Öppa
☐ Begränsa eller stänga
☐ Övrigt, ange något som i enkäten

För gåtorna på en

☐ Mycket intressant
☐ Intressant
☐ Inte intressant

Revidering av utvald skylt vid infarten "Skötselnar till Tidö-Lindö. Här håller vi oss 20 minuter och följer föreskrifter"

5

Sammanfattning

Färgkoder visar andel svar

"Alla intresserade" utgör summan av "Mycket intressant" och "Intressant"

	Mycket intressant % av svar	Intressant % av svar	Alla intresserade % av svar	Inte intressant % av svar
Naturstigar				
01 Bind ihop stigar	42,3	29,9	72,1	27,9
02 Fler naturstigar	37,8	29,9	67,7	32,3
03 Anpassa vissa stigar, barnvagn mm	18,9	35,8	54,7	45,3
04 Bänkar vid vattenkant	41,1	30,7	71,8	28,2
Västerängen				
05 Utegym	35,6	31,2	66,8	33,2
06 Grillplats med tak	24,9	34,3	59,2	40,8
07 Löpspår	23,3	31,2	54,5	45,5
Trafiksäkerhet				
08 Fler farthinder	25,0	24,0	49,0	51,0
09 Fler gatlykter	27,9	24,9	52,7	47,3
10 Skylt vid infarten	24,3	35,1	59,4	40,6
11 Trygghet för gående	16,3	38,6	55,0	45,0
Övrigt				
12 Handikapp-anpassa bryggor	13,0	42,5	55,5	44,5
13 Utveckla kioskaktivitet	21,3	39,6	60,9	39,1
14 Taxibåtar möjliggörs	19,4	45,3	64,7	35,3
15 Hundrastgård	12,9	17,4	30,3	69,7
16 Andra lekplats	13,4	20,4	33,8	66,2
Barn och ungdom				
BU1 Klättervägg	24,8	35,6	60,4	39,6
BU2 Ungdomslokal	24,3	49,5	73,8	26,2
BU3 Linbana	27,5	23,5	51,0	49,0
BU4 Snurrunga	20,8	30,7	51,5	48,5
BU5 Stor pulkabacke	49,1	20,8	69,8	30,2
BU6 Skateboard	22,5	28,4	51,0	49,0
Färgkoder	> 35		> 65	
	25 - 35		55 - 65	
	15 - 25		45 - 55	
	< 15		< 45	

Sammanfattningar



- Mycket stort intresse för
 - Fler och mer sammanhängande gångstigar, med bänkar vid vattenkant
 - Utegyms
 - Stor pulkabacke
 - Lokal för ungdomar
- Högst bland de övriga
 - Grillplats med tak (på Västerängen)
 - Skylt vid infarten
 - Utveckla kioskaktivitet
 - Möjliggör (anläggningsplats för) taxibåtar
 - Klättervägg
- Lägst intresse för
 - Andra lekplats
 - Hundrastgård

Sammanfattning av kommentarerna



- Vårda och bevara de vackra och unika naturvärdena på ön
 - Växter, små och stora djur och hur understödja förekomsten (utom sniglar, mygg och grävlingar)
 - Skötsel av grönomden och allmänningar upplevs som eftersatt
 - Mer röjning av sly och vass, men hur? Önskan om mer ordning och reda, förslag på naturvårdsplan
 - Attraktivare entré och idéer kring busshållplatsen
- Många fina och bra förslag om utveckling av Västerängen
 - Bygg vidare på befintlig lekplats, anlägg ingen ny någon annanstans
 - Utveckla badstranden (finare sand, brygga, ta bort stenen...lekmöjlighet i anslutning till strand mm.)
 - Löpslinga
 - Klosken
 - Plogad isbana
- Generellt ingen mer gatubelysning, utom möjligen vissa platser.
- Starka och motstridiga synpunkter på farthinder
 - Tydligare skyltning och information
 - Både bu och bä om farthinder etc.
 - Gör det lätt att göra rätt
 - Anlitade byggföretag mm som kör för fort
- Mer behöver göras betr. annektering och nedskräpning
 - Behövs en tydlighet vad gäller tomtgränser och angränsande allmänningar och efterlevnad
- Möjlighet till återvinning, sophantering och synpunkter kring våra soptunnor
- Önskan om cykelväg
- Hund bad och tankar kring hundar
- Övrigt: allt ifrån dagis, äldreboende, övervakning av bryggor, verktygs pool
- Oro för ekonomin att utveckling kostar och underhåll

Bilaga 3: Anläggning av utegymmet



Augusti 2018

Inmätning av området och
utsättning av hörnpinnar



Augusti - september 2018

Markberedning

Efter avslutad
markberedning lät vi
området "sätta sig" över
vintern





22 maj 2019

Montering påbörjas.
Redskapens delar har
övervintrat under en
presenning.



Monteringen är klar i slutet av maj 2019



1 juni 2019

Det översta lagret av fint grus krattas ut




15 juni

Skylden får sitt innehåll och gymmet invigs





I november får gymmet
belysning

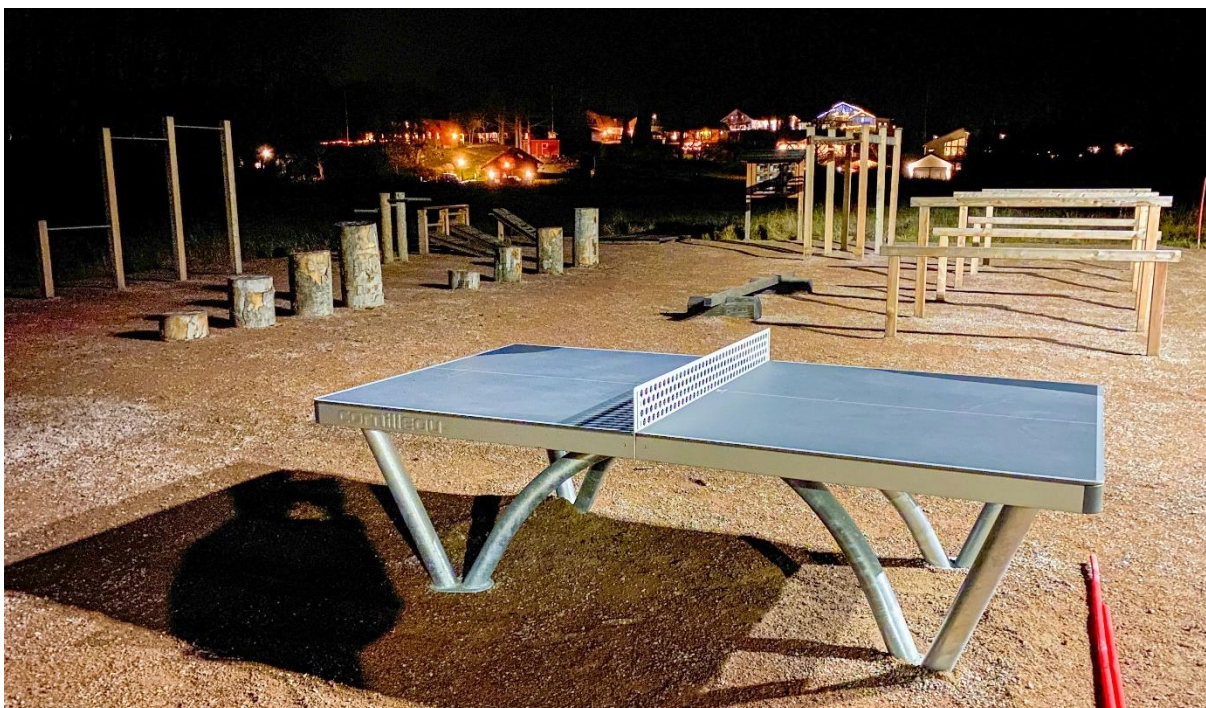

Maj 2020

Slutligen, en ny bänk för
vila mellan gympassen

Bilaga 4: Väderskyddet byggs



22 maj 2019

Markering av hörnen.

I bakgrunden syns en del av lekplatsen.



28 maj 2019

Plintarna är på plats.
I bakgrunden syns utegymmet.



15 juni 2019

Grunden är klar,
inklusive kantsten
och allmän
uppsnyggning.



31 augusti 2019



2 september 2019



25 november 2019



18 januari 2020

Eluttag installeras.



26 april 2020

Våren har kommit och grundmålning pågår.

Bänkar har burits in och väderskyddet kan börja användas.



25 maj 2020

Grillen har
kommit och
funnit sin plats



20 juli 2020


Målningen är
klar. Det återstår
bara en andra
strykning.

Bilaga 5. Förnyelse av strandområdet



Målbilden för strandområdet.

Planen modifierades delvis under arbetets gång, beroende på nya insikter och möjligheter.

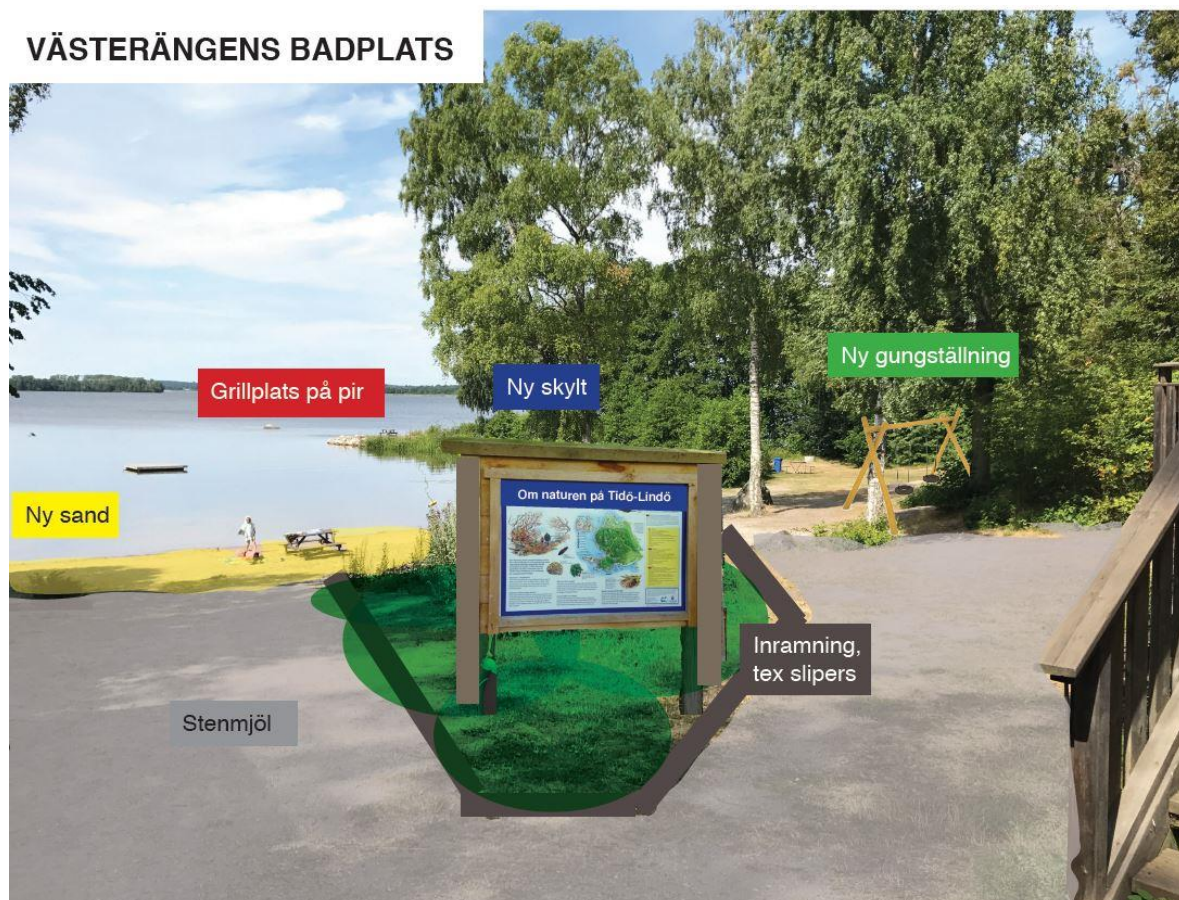



Mars 2019

Innan arbetet
påbörjas



Mars 2019

I förgrunden
den gamla
stigen mellan
stranden och
badbryggan



15 april 2019

Ny sand läggs ut



I förgrunden det område som skall bli till nya fikaplatsen



20 april 2019

Sanden på plats och bakom den ser man (ljusgrått) en del av den nya stigen mellan P-platsen och norra udden



9 maj 2019

Den nya stigen till
P-platsen, sedd
från badbryggan.
Mitt i bild den
nya solplatsen på
södra udden.



13 maj

Förnyelse av
norra udden



13 maj

Strandområdet
närmast vattnet
är klart



28 maj 2019

Norra udden är
klar så när som
på de nya
bänkarna



29 maj

Gungställningen
är klar



15 juni 2019

Badsäsongen har börjat och den förnyade stranden är mycket uppskattad.

Arbetet gör nu paus över sommaren



19 februari 2020

Anläggning av den nya fikaplatsen



21 februari

Återstår bara bord och bänkar




April – juli 2020

Nya bord och
bänkar.

Norra udden



Södra udden, vid
badbryggan

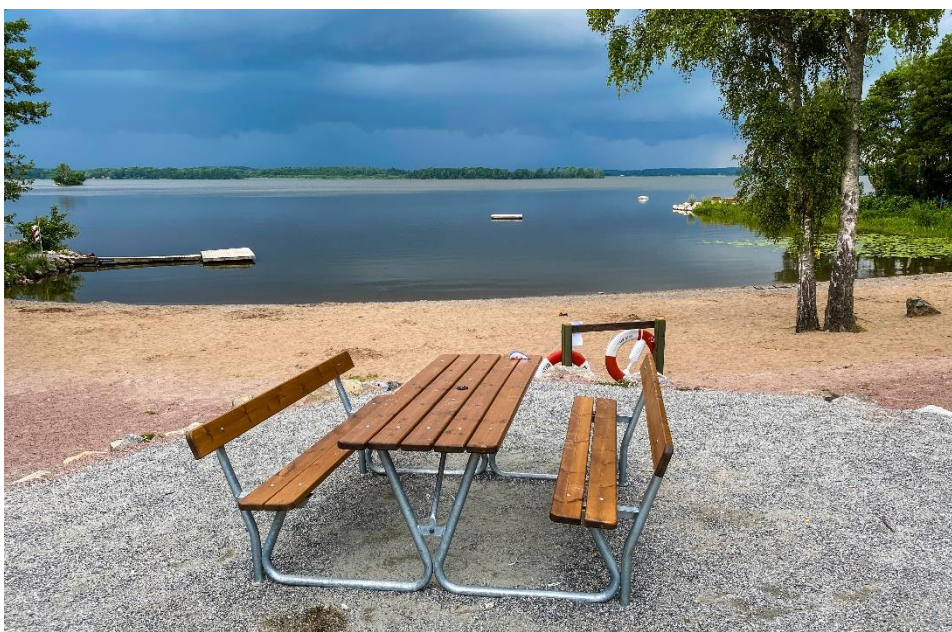

Nya fikaplatsen

Välkommen till Västerängen



Skylden på sin plats



BADPLATS TIDÖ-LINDÖ

Badstranden här på Tidö-Lindö är en privat badstrand som ägs och vårdas av boende på ön. Bada och ha kul, men tänk på att uppträda så att alla kan trivas vid badet.



STRANDEN




Dyk inte, det finns stenar i vattnet!

BADVETT

Svenska Livräddningssällskapet har utformat badvettregler som vi följer här på stranden:

- Bada alltid tillsammans med någon.
- Simma längs med stranden.
- Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
- Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
- Simma inte under bryggor.
- Spring inte på brygga - du kan halka.
- Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
- Undvik upplåsbara leksaker på djupt vatten.
- Lek inte med livräddningsmaterial.
- Ha alltid något mellan dig och den nödstälde, "den förlängda armen".
- Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
- Undvik solens starka strålar mitt på dagen.

HLR VID DRUNKNING

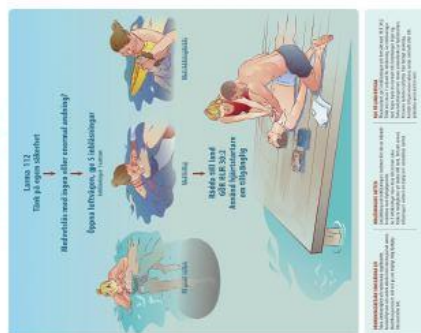

ISVETT

- Var aldrig ensam på isen.
- Ha alltid med dig islubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
- Prova alltid isen med en ispik om du är osäker.
- Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Känns ska vara minst 10cm tjock.
- Tänk på att ny is, våris, snöskottis och havsis kan vara svaga.
- Lär dig var isens svaga punkter är: vass, råk, bryggor, bro, udder, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.
- Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
- Ha alltid något mellan dig och den nödstälde, "den förlängda armen".
- Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

INFORMATION OM BADPLATSEN



Kioskens är ofta öppen under sommaren vid bra väder. Se kioskens för vilka öppettider som gäller. Här kan du även för en mindre avgift låna nyckel till toiletten.



Vi vill att stranden ska vara ren. Var en av dem som inte ströpar ner och lämna stranden som du själv vill att den ska se ut när du kommer. Blå soptunnor finns vid parkeringen, men ta ännu hellre med dig dina sopor hem.



Hundar är välkomna att bada på hundbadplatsen. För att visa hänsyn till allergiska och hundrädda ska hunden vara kopplad och inte hållas i närheten av andra badgäster.



Grillning får endast ske i de fasta grillarna och inte så stor andra badgäster.

Om ni flyttar bänkar, var vänlig och ställ tillbaka dem efteråt.

ISKARTA



Kartan visar isbildningen kring Tidö-Lindö efter normal frysoordning. Ju mörkare blå färg desto tidigare brukar isen lägga sig. Strandområdet och strandkanten in mot Åsköviken fryser först.

På de områden som är markerade med blå streck eller raster brukar isen vara mycket svag eller öppen. Observera att det även är vanligt att rakar och svaga tar uppstår på fler platser än vad kartan anger. Och skillnaden kan vara mycket stor från år till år, men även från dag till dag!

Så ta det lugnt om du ger dig ut på isen och följ isvettreglerna ovan.

Skiptens plats är markerad med röd cirkel.



Strandtavlan är framtagen inom Leaderprojektet "Vision Tidö-Lindö".

Om du har frågor om badplatsen eller andra anordningar på ön, kontakta gärna Tidö-Lindös samfällighetsförenings styrelse: styrelsen@tidolindo.se.


Strandskylten på sin plats



Bilaga 6: Fototävlingen



Framröstning
av sex
vinnande bilder
från 29
finalister, vid
årsstämman
2020

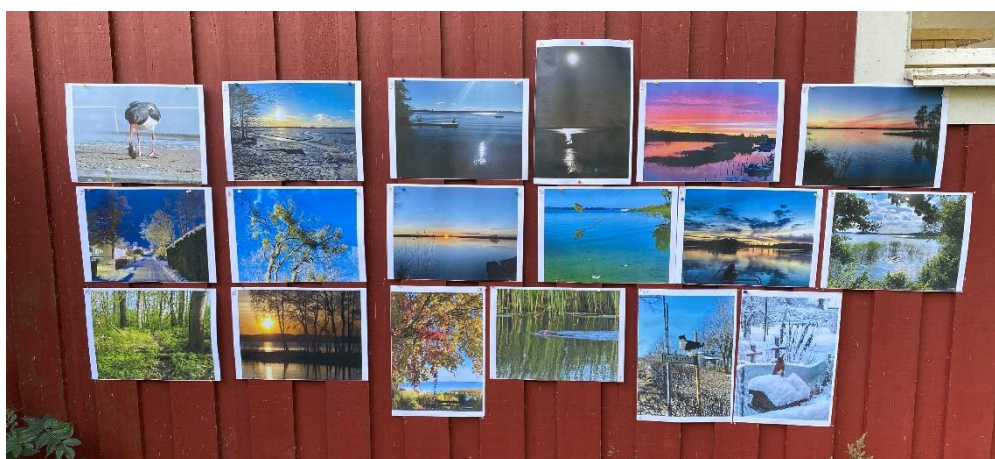

De 29
finalisterna



De sex vinnande bilderna upptryckta på canvas och hängda i föreningslokalen.



Bilaga 7: Säkerhets och livräddningsutbildning



Sjöräddningens besök 18 maj 2019



HLR-utbildning i föreningslokalen



Kurs i isvett 15 januari 2020

Bilaga 8: Personer som bidragit med frivillig (obetald) tid

Projektgruppen

Lars Hallstadius
Hans Thell
Heidi Leppäniemi

Mårten Gustafsson
Michaela Sandvall
Gunhild Sünger

Daniel Lind
Regina Tunebrant
Marie Hammarbäck

Övriga som bidragit med frivilligt (obetalt) arbete

Anna Hallberg
Annie Zaar Issa
Andreas Hammarbäck
Anne-Lie Renström
Arnar Thorisson
Billy Ramström
Birgitta Rydqvist
Bo Dahlström
Britt-Marie Lindevret
Börje Gustafsson
Carina Akterhag
Cecilia Janås
Cecilia Stanell
Charlotte Hörnquist
Charlotte Lundgren
Christer Bäckström
Christer Stridh
Emma Wegrell
Erik Dahlén
Gustaf Renström
Helena Rönnbäck
Helena Smith

Henrik Ohlsson
Hugo Tegenfeldt
Ida Persson
Ingalill Tengström Thell
Ingemar Moritz
Jaana Vinnal
Jan Aspgren
Jan Bröms
Jenny Ek
Jens Nylander
Johan Hörnquist
John Pedersen
Kjell Eriksson
Kristina Steen
Margareta Ohlson
Markus Stanell
Melanie Hallstadius
Nicklas Monrad
Niclas Weber
Niklas Lundberg
Nils-Erik Ohlson
Per Larsson

Per Mattsson
Peter Bäckström
Primus Nyxén
Rolf Olsson
Ronald Malcher
Sirpa Lundqvist
Sofie Svensk
Stefan Karlsson
Stefan Lundin
Stellan Carlhed
Stephan Skoog
Susan Tegenfeldt
Susanne Hammarlund
Tanja Hallstadius
Therese Steen Olsson
Tomas Henriksson
Tomas Gustavsson
Ulf Rydqvist
Ulla Dalenfeldt Svensson
Åsa Ledin

**Vi tackar också alla barn och ungdomar som deltagit,
tillsammans med sina föräldrar**

Bilaga 9: Projektets sponsorer

Vision Tidö-Lindö



*Genomfört med hjälp av EU-medel, frivilliga arbetsinsatser
samt sponsring från lokala företag*

Utegymmet —



Väderskyddet —



HLR-utbildning —



Övrigt —





tidolindo.se/vision-tidö-lindö



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



LEADER
MILJÖVALEN



LEADER
MILJÖVALEN
